

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称: 兴隆足球公园项目

项目编号: 川投资备【2209-510701-99-01-674677】FGQB-0093 号

建设地点: 绵阳市科技城新区兴隆社区

验收单位: 绵阳新投实业有限公司



2025 年 9 月

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	兴隆足球公园项目	行业类别	社会事业类项目
主管部门 (或主要投资人)	绵阳新投实业有限责任公司	项目性质	新建
水土保持方案审批部门、文号及时间	科新社治审【2023】7号、2023年8月7日		
水土保持方案变更审批部门、文号及时间	/		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	/		
项目建设起止时间	2023年5月-2023年12月		
水土保持方案编制单位	四川天辰工程咨询有限公司		
水土保持初步设计单位	/		
水土保持监测单位	/		
水土保持施工单位	四川域涌建筑工程有限公司		
水土保持监理单位	/		
水土保持设施验收 鉴定书编制单位	四川天辰工程咨询有限公司		

二、验收意见

根据水土保持法律法规和《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）、四川省水利厅转发《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》川水函〔2018〕887号，绵阳新投实业有限责任公司于2025年9月4日在绵阳市科技城新区兴隆社区主持召开了《兴隆足球公园项目》水土保持项目设施竣工验收会议。参加会议的有建设单位绵阳新投实业有限责任公司、施工单位四川域涌建筑工程有限公司、水土保持方案编制及验收报告编制单位四川天辰工程咨询有限公司等代表及特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。

验收组查看了工程现场，查阅了技术资料，听取了建设单位、监理、施工单位关于水土保持工作情况，以及各单位的补充说明，经讨论和认真研究，形成验收意见如下：

（一）项目概况

本项目位于绵阳市科技城新区兴隆社区，项目总用地面积：28507.97m²（其中球场用地面积：13732.52m²，配套设施用地面积6142.20m²，绿地用地面积8633.25m²），建筑密度21.55%，绿地率30.28%。建设内容包括：标准五人制足球场1片、综合训练场1片（含五人制1片）、标准八人制足球场3片；其中：休闲场地露天休息区1处、足球俱乐部广场1处、足球文化区1处；以及配套设施含管理房和卫浴间3处等。

本项目总占地面积为2.85hm²，均为永久占地。项目于2023年5月

开工，2023年12月完工，总投资为2800万元，其中土建投资2140.11万元，资金来源为企业自筹。

（二）水土保持方案主要内容批复情况

2023年8月7日，绵阳市科技城新区社会治理局对《兴隆足球公园项目水土保持方案报告表》进行了批复，批复文号（科新社治审【2023】7号）。

根据《报告表》的批复，批复水土流失防治责任范围面积 2.85hm²，包括足球场区、构建筑物区、绿化工程区。

防治标准等级：西南紫色土区一级标准。

防治目标：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1，渣土防护率94%，表土保护率92%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率25%。

批复方案措施如下：

足球场区：表土剥离4119.76m³，透水混凝土13732.52m²，DN100PVC导水管755.10m，人造草皮13732.52m²，密目网遮盖13732.52m²。

构建筑物区：表土剥离1842.66m³，透水混凝土5336.00m²，雨水管道544m，C20砼排水沟200m，洗车池1处，密目网遮盖6142.20m³。

绿化工程区：表土剥离2589.98m³，表土回填8552.40m³，雨水管道136m，植草沟563m，景观绿化工程8633.25m²，密目网遮盖8633.25m²。

（三）水土保持初步设计及施工图设计情况

本项目水土保持设计纳入主体设计，2023年5月，由成都美厦建筑设计有限公司完成了《兴隆足球公园项目》施工图设计，该设计包

含了水土保持部分。

2023 年 6 月，绵阳新投实业有限责任公司取得了《四川省房屋建筑工程施工图设计文件审查备案报告》，备案编号：绵新区图审备案【2023】39 号。

（四）水土保持补偿费缴纳情况

根据绵阳市科技城新区社会治理局《关于兴隆足球公园项目水土保持方案报告表的批复》，（科新社治审【2023】7 号），批复的水土保持方案报告书中明确项目征占地面积为 2.85hm²，水土保持补偿费标准按 1.3 元/平方米征收，须依法缴纳水土保持补偿费 37060.36 元。

建设单位已于 2023 年 8 月 16 日一次性足额缴纳了水土保持补偿费 37060.36 元。

（五）水土保持监测情况

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160 号）等有关规定，本项目不开展水土保持监测工作，由生产建设单位应当依法履行水土流失防治责任和义务。

（六）验收报告编制情况和主要结论

表 1 占地面积对比情况

占地属性	项目组成	水保方案防治责任的范围 (hm ²)	实际防治责任的范围 (hm ²)	备注
永久占地	足球场区	1.37	1.37	
	构建筑物区	0.62	0.62	
	绿化工程区	0.86	0.86	
合 计		2.85	2.85	

表 2 水土保持措施完成情况对照表

防治分区	水土保持措施		单位	方案数量	实施数量	变化
	措施类型	措施项目				
足球场区	工程措施	表土剥离	m ³	4119.76	4119.76	
		透水混凝土	m ²	13732.52	13732.52	
		DN100PVC 导水管	m	755.10	780.00	+24.90
	植物措施	人造草皮	m ²	13732.52	13732.52	
	临时措施	密目网遮盖	m ²	13732.52	11350.00	-2382.52
构筑物区	工程措施	表土剥离	m ³	1842.66	1842.66	
		透水混凝土	m ²	5336.00	5336.00	
		雨水管道	m	544.00	560.00	+16.00
		C20 砼排水沟	m	200.00	200.00	
		雨水口	个	0.00	18.00	+18.00
		溢流雨水篦子	个	0.00	8.00	+8.00
	临时措施	洗车池	处	2.00	1.00	-1.00
		密目网遮盖	m ²	6142.20	5800.00	-342.20
绿化工程区	工程措施	表土剥离	m ³	2589.98	2589.98	
		表土回填	m ³	8552.40	8552.40	
		雨水管道	m	136.00	155.00	+19.00
		植草沟	m	563.00	545.00	-18.00
	植物措施	景观绿化工程	m ²	8633.25	8633.25	
	临时措施	密目网遮盖	m ²	8633.25	8633.25	

表 3 水土保持投资完成情况对照表 (万元)

序号	工程或费用名称	方案投资	实际投资	增减变化
	第一部分 工程措施	484.64	487.07	+2.43
	第二部分 植物措施	768.20	768.20	
	第三部分 临时措施	20.00	17.92	-2.08
	第四部分 独立费用	11.97	11.97	
I	第一至四部分合计	1284.81	1285.16	+0.35
II	基本预备费	1.20		-1.2
III	水土保持补偿费	3.71	3.71	
IV	工程投资合计	1289.72	1288.87	-0.85

兴隆足球公园项目水土保持措施布局、投资控制和资金使用合理，项目实际完成水土保持工程总投资为 1288.87 万元，其中主体工程已计列的投资为 1273.19 万元，包括：工程措施费 487.07 万元，植物措施费 768.20 万元，临时措施费 17.92 万元。新增水土保持投资 15.68 万元，主要包括独立费用 11.97 万元，水土保持补偿费 3.706 万元（37060.36 元）已于 2023 年 8 月缴纳完毕。

（七）水土保持效益

在工程施工中，施工单位根据项目实际情况对部分措施进行了局部调整，部分措施工程量发生了变化，水土保持措施在工程建设中起到了减少水土流失的作用，保证了水土保持功能不降低。

该项目落实的水土保持防治措施较好的控制和减少了施工过程中的水土流失，水土流失各项防治指标均达到了目标值。

表 4 效益计算表

序号	指标名称	防治目标	实现目标	达标情况
1	水土流失治理度（%）	97	100	达标
2	土壤流失控制比	1	1.39	达标
3	渣土防护率（%）	94	98.55	达标
4	表土保护率（%）	92	100	达标
5	林草植被恢复率（%）	97	100	达标
6	林草覆盖率（%）	25	78.25	达标

（八）验收结论

经验收组讨论，本项目实施过程中严格落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土保持设施总体达到了国家水土保持法律法规及相关技术规范、标准要求，质量合

格。同意该项目水土保持设施通过验收。

（九）后续管护要求

1、加强和完善水土保持工程相关资料的归档和管理，方便今后查阅和使用；尤其做好重要资料的备份，避免资料的遗失。

2、管理单位应进一步落实管护责任，加强汛期安全巡查，加强已建成水土保持设施管护，确保其正常运行和发挥效益。

3、继续加强项目区林草管理，日常养护，对生长不良对树木及时进行抚育、补植、更新，使其水土保持功能不断增强，发挥长期、稳定的水土保持效果，起到改善生态环境的作用。

4、加强与市、县水行政主管部门的沟通和联系，接收并积极配合当地水行政主管部门的监督检查，进一步健全水土保持工作的管理制度，使水土保持工作规范化、制度化和长期化。

三、验收组成员签字表

分 工	姓 名	单 位	职务/职称	签 字	备注
组 长	杨小翼	绵阳新投实业有限责任公司	项目负责人	杨小翼	建设单位
成 员	刘胤	四川省水土保持学会	高工	刘胤	省级专家 库水土保持 专家
	龙海波	四川天辰工程咨询有限公司	工程师	龙海波	水土保持 验收报告 编制单位
	唐万辉		助理工程师	唐万辉	
	姜俊杰	绵阳市水利规划设计研究院 有限公司	总监	姜俊杰	监理单位
	唐万辉	四川天辰工程咨询有限公司	助理工程师	唐万辉	水土保持 方案编制 单位
	邹伦刚	四川域涌建筑工程有限公司	项目经理	邹伦刚	施工单位

四川省固定资产投资项目备案表

填报单位：绵阳新投实业有限责任公司

备案申报时间：2022年09月14日

项目单位基本情况	*单位名称	绵阳新投实业有限责任公司		
	单位类型	有限责任公司（分公司）		
	证照类型	统一社会信用代码	证照号码	91510700MA66RXRF55
	*法定代表人（责任人）	胡强	固定电话	13990160073
	项目联系人	申凯元	移动电话	15508040055
项目基本情况	*项目名称	兴隆足球公园项目		
	项目类型	基本建设（发改）	建设性质	新建
	所属行业	体育		
	*建设地点详情	四川省绵阳市科技城新区兴隆社区（科技城新区二环兴隆高架侧）		
	*项目总投资及资金来源	项目总投资额【2800】万元，其中：使用外汇【0】万美元，企业自筹【2800】万元；		
	拟开工时间（年月）	2023年02月	拟建成时间（年月）	2023年12月
	*主要内容及规模	项目占地面积33203.53平方米，主要建设内容为足球场及相关配套基础设施等。		
声明和承诺	符合产业政策	备案者声明：		√ 阅读产业政策
		√ 属于《产业结构调整指导目录》的鼓励类项目 □ 属于未列入《产业结构调整指导目录》的允许类项目		（二选一）
		□ 属于《西部地区鼓励类产业目录》的项目		（可选可不选）
		√ 不属于产业政策禁止投资建设，不属于实行核准或审批管理的项目		（必选）
	填报信息真实	√ 保证提供的项目相关资料及信息是真实、准确、完整和合法的，无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，对项目信息的真实性负责，如有不实，我单位愿意承担相应的责任，并承担由此产生的一切后果。		

填写说明：1. 请用“√”勾选“□”相应内容。
2. 表中“*”标注事项为构成备案项目信息变更的重要事项。
3. 表格中栏目不够填写时可在备注中说明。

备注	
备案机关确认信息	绵阳新投实业有限责任公司（单位）填报的兴隆足球公园项目（项目）备案信息已收到。根据《企业投资项目核准和备案管理条例》、《四川省企业投资项目核准和备案管理办法》及相关规定，已完成备案。 备案号：川投资备【2209-510701-99-01-674677】FGQB-0093号 若上述备案事项发生重大变化，或者放弃项目建设，请你单位及时通过投资项目在线审批监管平台告知备案机关，并办理备案信息变更。 备案机关：绵阳科技城新区经济运行局 2022年09月20日

项目登记信息变更记录

序号	变更项	变更前信息	变更后信息	变更时间
1	项目总投资及资金来源	项目总投资额【4100】万元，其中：使用外汇【0】万美元，企业自筹【4100】万元；	项目总投资额【2800】万元，其中：使用外汇【0】万美元，企业自筹【2800】万元；	2022-09-27
2	建设内容及规模	项目占地面积56758.14平方米，主要建设内容为足球场、篮球场和羽毛球场及相关配套基础设施等。	项目占地面积33203.53平方米，主要建设内容为足球场及相关配套基础设施等。	2022-09-27

注：

1. 备案表根据备案者基于真实性承诺提供的项目备案信息自动生成，仅表明项目已依法履行项目信息告知的备案程序，不构成备案机关对备案事项内容的实质性判断或保证。
2. 备案号“【】”内代码为投资项目在线审批监管平台赋码生成的项目唯一代码，可通过平台（<http://tzxm.sczfw.gov.cn>）使用项目代码查询验证项目备案情况，有关部门统一使用项目代码办理相关手续。
3. 按照国家相关要求，请及时通过在线平台如实将项目开工建设、建设进度、竣工等基本信息报送项目备案机关，并遵循诚信和规范原则。

填写说明：1. 请用“√”勾选“□”相应内容。
2. 表中“*”标注事项为构成备案项目信息变更的重要事项。
3. 表格中栏目不够填写时可在备注中说明。



(扫描二维码，查看项目状态)

- 填写说明：
1. 请用“√”勾选“□”相应内容。
 2. 表中“*”标注事项为构成备案项目信息变更的重要事项。
 3. 表格中栏目不够填写时可在备注中说明。

水土保持行政许可承诺书

编号：科新社治审〔2023〕7 号

项目名称	兴隆足球公园项目		
建设地点	位于绵阳市科技城新区兴隆社区,项目区 1#地块中心位置经度: 104° 39' 56.72" 、纬度: 31° 29' 0.89" , 2#地块中心位置经度: 104° 40' 3.11" 、纬度: 31° 29' 1.70" , 3#地块中心位置经度: 104° 40' 1.51" 、纬度: 31° 28' 57.63" 。		
区域评估情况	开发区名称: 绵阳科技城新区		
	水土保持区域评估报告审批机关、文号和时间: 无		
水土保持方案公开情况	公示网站: 水土保持公示网 https://www.yanshou100.com/item_detail.html?id=219266		
	起止时间: 2023 年 6 月 25 日至 2023 年 7 月 6 日		
	公众意见接收和处理情况: 无		
生产建设单位	名称: 绵阳新投实业有限责任公司		
	统一社会信用代码: 91510700MA66RXRF55		
	地 址: 绵阳科创区创新中心 2 号楼 314 室		
	电子信箱: 304590605@qq.com		
	法人代表: 胡强		联系电话: 13990160073
	授权经办人姓名: 杨小翼		联系电话: 15892651157
证件类型及号码: 513125199009101614			

生产建设单位承诺内容	1.已经知晓并将认真履行水土保持各项法定义务。 2.所填写的信息真实、完整、准确；所提交的水土保持方案符合相关法律法规、技术标准的要求。 3.严格执行水土保持“三同时”制度，按照所提交的水土保持方案，落实各项水土保持措施，有效防治项目建设中的水土流失；项目投产使用前完成水土保持设施自主验收并报备。 4.依法依规按时足额缴纳水土保持补偿费。 5.积极配合水土保持监督检查。 6.愿意承担作出不实承诺或者未履行承诺的法律责任和失信责任。 7.其他需承诺的事项： 法人代表（签字）： 生产建设单位（盖章）： 2023年8月7日
审批部门许可决定	上述承诺以及提交的水土保持方案，材料完整，格式符合规定要求，准予许可。应当缴纳水土保持补偿费37060.36元。 水行政主管部门（盖章）： 2023年8月7日

备注：1.本表除编号、许可决定部分外，均由生产建设单位填写。

2.本表“公众意见接收和处理情况”因内容较多填写不下时，另附页填写。

3.本表“生产建设单位承诺内容”和“审批部门许可决定”不可分割，分割无效。

4.本表一式3份，生产建设单位、水行政主管部门（或者其他审批部门）、监督检查部门各执1份

四川省房屋建筑工程施工图设计文件审查备案报告

备案编号: **锦新区图审备案【2023】38号**

建设单位	绵阳新投实业有限责任公司	联系人	杨文文
工程项目	兴隆足球公园项目	联系电话	13404002387
子项名称	室外工程	委托日期	2023年6月7日
工程地址	绵阳市科技城新区兴隆社区	完成日期	2023年6月12日
勘察单位		资质等级	
设计单位	成都美厦建筑设计有限公司	资质等级	甲级
审查机构	四川晟源建设工程咨询有限公司	资质等级	一类

工程概况



建筑性质及用途	/	结构类型	/	建筑总高度(m)	/
工程 设计规模	/	建筑面积(m ²)	/	建筑层数(地上/地下)	/

审查情况

审查专业	审查结论	消防审查结论	人防审查结论	绿色建筑 设计次数	复审 次数	违反 强条数	审查人	审核人	违反工程建设强制性标准 编号及条文编号
勘察									
建筑	合格	/	/	/	0	0	罗芳清		
结构									
抗震									
给排水	合格	/	/	/	0	0	文迎春		
电气	合格	/	/	/	0	0	王燕		
暖通									

审查合格书编号 22441-202307-0027 审查报告编号 22441-202307-0027

备案情况

综合结论	合格	备案部门意见
处理意见	一般修改	
经办人: 	审查机构(盖章) 	经办人: 
负责人: 	2023年6月12日	负责人: 
备注	本工程应经当地相关部门审批通过后方可实施。	



兴隆足球公园项目

水土保持设施

单位工程和分部工程验收签证

单位工程名称：足球场区

分部工程：工程措施、植物措施、临时措施

所含单元工程：表土剥离、透水混凝土、DN100PVC
导水管、人造草皮、密目网遮盖

2025 年 8 月 20 日

兴隆足球公园项目

水土保持设施

单位工程和分部工程验收签证

建设单位：绵阳新投实业有限责任公司



设计单位：成都美厦建筑设计有限公司



监理单位：绵阳市水利规划设计研究院有限公司



施工单位：四川域涌建筑工程有限公司



验收时间：2025 年 8 月 20 日

验收地点：绵阳市科技城新区

水土保持设施单位工程和分部验收签证书

验收主持单位：绵阳新投实业有限责任公司

参加单位：成都美厦建筑设计有限公司、绵阳市水利规划设计研究院有限公司、四川域涌建筑工程有限公司

验收时间：2025 年 8 月 20 日

地点：工地现场

一、工程概况

本工程建设内容包括：标准五人制足球场 1 片、综合训练场 1 片（含五人制 1 片）、标准八人制足球场 3 片；其中：休闲场地露天休息区 1 处、足球俱乐部广场 1 处、足球文化区 1 处。

（一）工程主要建设内容

足球场区工程措施主要有：表土剥离 4119.76m^3 、透水混凝土 13732.52m^2 、DN100PVC 导水管 780.00m；植物措施主要有：人造草皮 13732.52m^2 ；临时措施主要有：密目网遮盖 11350.00m^2 。

（二）工程建设有关单位

建设单位：绵阳新投实业有限责任公司

设计单位：成都美厦建筑设计有限公司

监理单位：绵阳市水利规划设计研究院有限公司

施工单位：四川域涌建筑工程有限公司

（三）工程建设过程

主体工程于 2023 年 5 月开工，2023 年 12 月完工。足球场区表土剥离施工时间为 2023 年 5 月~2023 年 6 月；密目网遮盖施工时间为 2023 年 5 月~2023 年 7 月；DN100PVC 导水管施工时间为 2023 年 8 月~2023 年 9 月；透水混凝土施工时间为 2023 年 9 月~2023 年 10 月；人造草皮施工时间为 2023 年 11 月。

二、合同执行情况

合同双方都按照内容进行管理、计量支付与结算等。

三、工程质量评定

兴隆足球公园项目的足球场区划分为 3 个分部工程，5 个单元工程。单元工程全部合格，合格率 100%。

本单位工程质量评定等级为合格，分部工程的质量评定等级为合格。

四、存在的问题及处理意见

无

五、验收结论及对工程管理的建议

兴隆足球公园项目足球场区中表土剥离、透水混凝土、DN100PVC 导水管、人造草皮、密目网遮盖工程施工质量合格。

兴隆足球公园项目

水土保持设施

单位工程和分部工程验收签证

单位工程名称：构建筑物区

分部工程：工程措施、临时措施

所含单元工程：表土剥离、透水混凝土、雨水管道、
C20 砼排水沟、雨水口、溢流雨水篦子、洗车池、密
目网遮盖

2025 年 8 月 20 日

兴隆足球公园项目

水土保持设施

单位工程和分部工程验收签证

建设单位：绵阳新投实业有限责任公司



设计单位：成都美厦建筑设计有限公司



监理单位：绵阳市水利规划设计研究院有限公司



施工单位：四川域涌建筑工程有限公司



验收时间：2025 年 8 月 20 日

验收地点：绵阳市科技城新区

水土保持设施单位工程和分部验收签证书

验收主持单位：绵阳新投实业有限责任公司

参加单位：成都美厦建筑设计有限公司、绵阳市水利规划设计研究院有限公司、四川域涌建筑工程有限公司

验收时间：2025 年 8 月 20 日

地点：工地现场

一、工程概况

本工程建设内容包括：配套道路及设施含管理房和卫浴间 3 处等。

（一）工程主要内容

构建筑物区工程措施主要有：表土剥离 1842.66m^3 、透水混凝土 5336.00m^2 、雨水管道 560.00m 、C20 砼排水沟 200.00m 、雨水口 18 个、溢流雨水篦子 8 个；临时措施主要有：洗车池 1 处、密目网遮盖 5800.00m^2 。

（二）工程建设有关单位

建设单位：绵阳新投实业有限责任公司

设计单位：成都美厦建筑设计有限公司

监理单位：绵阳市水利规划设计研究院有限公司

施工单位：四川域涌建筑工程有限公司

（三）工程建设过程

主体工程于 2023 年 5 月开工，2023 年 12 月完工。构建筑物区洗车池施工时间为 2023 年 5 月；表土剥离施工时间为 2023 年 5 月~2023 年 6 月；密目网遮盖施工时间为 2023 年 5 月~2023 年 7 月；雨水管道施工时间为 2023 年 8 月~2023 年 9 月；C20 砼排水沟施工时间为 2023 年 8 月~2023 年 9 月；透水混凝土施工时间为 2023 年 9 月~2023 年 10 月；雨水口施工时间为 2023 年 9 月~2023 年 10 月；溢流雨水篦子施工时间为 2023 年 9 月~2023 年 10 月。

二、合同执行情况

合同双方都按照内容进行管理、计量支付与结算等。

三、工程质量评定

兴隆足球公园项目的构建筑物区划分为 2 个分部工程，8 个单元工程。单元工程全部合格，合格率 100%。

本单位工程质量评定等级为合格，分部工程的质量评定等级为合格。

四、存在的问题及处理意见

无

五、验收结论及对工程管理的建议

兴隆足球公园项目构建筑物区中表土剥离、透水混凝土、雨水管道、C20 砼排水沟、雨水口、溢流雨水篦子、洗车池、密目网遮盖工程施工质量合格。

兴隆足球公园项目

水土保持设施

单位工程和分部工程验收签证

单位工程名称：绿化工程区

分部工程：工程措施、植物措施、临时措施

所含单元工程：表土剥离、表土回填、雨水管道、植
草沟、景观绿化工程、密目网遮盖

2025 年 8 月 20 日

兴隆足球公园项目

水土保持设施

单位工程和分部工程验收签证

建设单位：绵阳新投实业有限责任公司



设计单位：成都美厦建筑设计有限公司



监理单位：绵阳市水利规划设计研究院有限公司



施工单位：四川域涌建筑工程有限公司



验收时间：2025 年 8 月 20 日

验收地点：绵阳市科技城新区

水土保持设施单位工程和分部验收签证书

验收主持单位：绵阳新投实业有限责任公司

参加单位：成都美厦建筑设计有限公司、绵阳市水利规划设计研究院有限公司、四川域涌建筑工程有限公司

验收时间：2025 年 8 月 20 日

地点：工地现场

一、工程概况

本工程建设内容主要为足球公园周边的绿化工程。

（一）工程主要内容

绿化工程区工程措施主要有：表土剥离 2589.98m^3 、表土回覆 8552.40m^2 、雨水管道 155.00m 、植草沟 545.00m ；植物措施主要有：景观绿化工程 8633.25m^2 ；临时措施主要有：密目网遮盖 8633.25m^2 。

（二）工程建设有关单位

建设单位：绵阳新投实业有限责任公司

设计单位：成都美厦建筑设计有限公司

监理单位：绵阳市水利规划设计研究院有限公司

施工单位：四川域涌建筑工程有限公司

（三）工程建设过程

主体工程于 2023 年 5 月开工，2023 年 12 月完工。绿化工程区表土剥离施工时间为 2023 年 5 月～2023 年 6 月；密目网遮盖施工时间为 2023 年 5 月～2023 年 7 月；雨水管道施工时间为 2023 年 8 月；表土回覆施工时间为 2023 年 9 月～2023 年 10 月；植草沟施工时间为 2023 年 11 月；景观绿化工程施工时间为 2023 年 11 月。

二、合同执行情况

合同双方都按照内容进行管理、计量支付与结算等。

三、工程质量评定

兴隆足球公园项目的绿化工程区划分为 3 个分部工程，6 个单元工程。单元工程全部合格，合格率 100%。

本单位工程质量评定等级为合格，分部工程的质量评定等级为合格。

四、存在的问题及处理意见

无

五、验收结论及对工程管理的建议

兴隆足球公园项目绿化工程区表土剥离、表土回填、雨水管道、植草沟、景观绿化工程、密目网遮盖工程施工质量合格。

单位工程和分部工程验收组成员签字表

工程名称：兴隆足球公园项目

单位工程：足球场区

分部工程：工程措施、植物措施、临时措施

日期：

姓名	单位	职务或职称	签字
杨小翼	绵阳新投实业有限责任公司	项目负责人	杨小翼
徐来	成都美厦建筑设计有限公司	项目负责人	徐来
姜俊杰	绵阳市水利规划设计研究院有限公司	总监	姜俊杰
邹伦刚	四川域涌建筑工程有限公司	项目经理	邹伦刚

单位工程和分部工程验收组成员签字表

工程名称：兴隆足球公园项目

单位工程：构建筑物区

分部工程：工程措施、临时措施

日期：

姓名	单位	职务或职称	签字
杨小翼	绵阳新投实业有限责任公司	项目负责人	杨小翼
徐来	成都美厦建筑设计有限公司	项目负责人	徐来
姜俊杰	绵阳市水利规划设计研究院有限公司	总监	姜俊杰
邹伦刚	四川域涌建筑工程有限公司	项目经理	邹伦刚

单位工程和分部工程验收组成员签字表

工程名称：兴隆足球公园项目

单位工程：绿化工程区

分部工程：工程措施、植物措施、临时措施

日期：

姓名	单位	职务或职称	签字
杨小翼	绵阳新投实业有限责任公司	项目负责人	杨小翼
徐来	成都美厦建筑设计有限公司	项目负责人	徐来
姜俊杰	绵阳市水利规划设计研究院有限公司	总监	姜俊杰
邹伦刚	四川域涌建筑工程有限公司	项目经理	邹伦刚



照片资料（一）



照片资料（二）



照片资料（三）





照片资料（四）



照片资料（五）



照片资料（六）

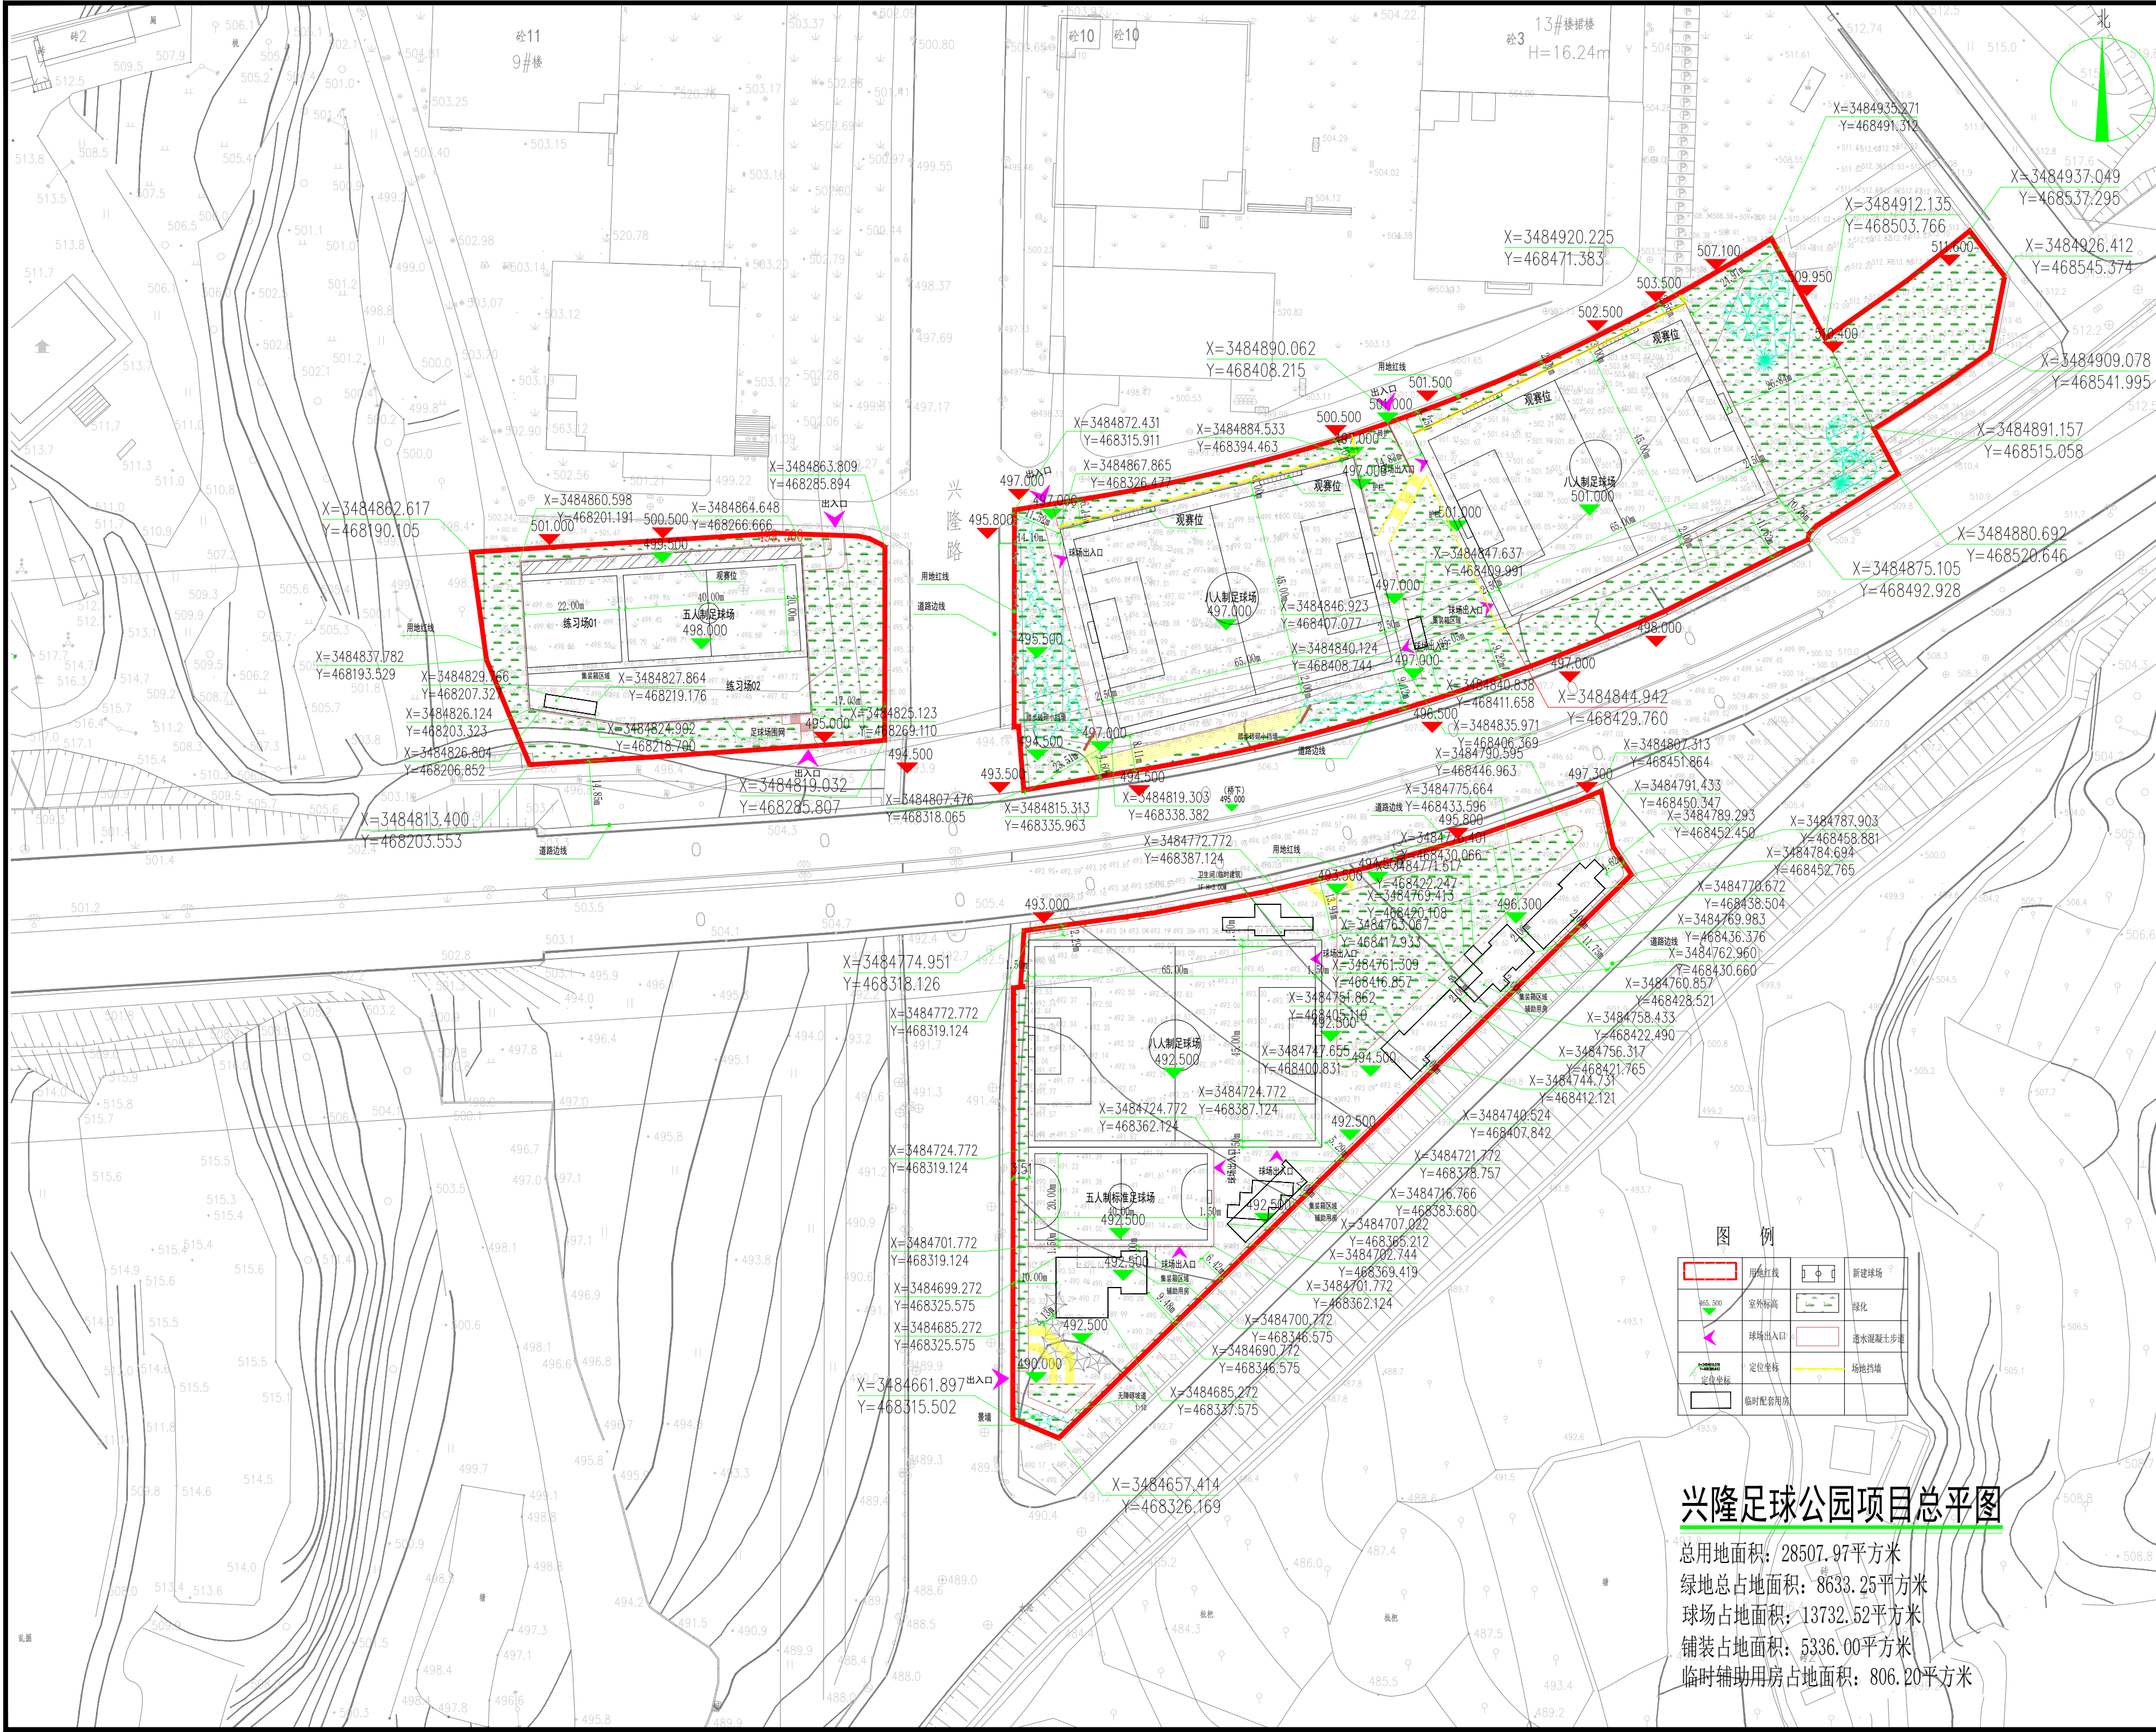

中安畅达工程科技有限公司
Zhongan Changda Engineering Technology Co., Ltd

设计资质等级: 建筑行业乙级

证书编号: A251036596

设计单位盖章

注册师签字

注册师盖章

项目负责人	于哲	于哲
审定	于哲	于哲
审核	田曦	田曦
校核	米福星	米福星
专业负责人	邓良云	邓良云
设计	田苏苏	田苏苏
绘图	田苏苏	田苏苏

建设单位	绵阳新投实业有限责任公司		
工程名称	兴隆足球公园项目		
项目名称	兴隆足球公园		
图纸名称	总平图		
设计阶段	方案	专业	
工程号		比例	
图号	01	日期	2022.10


图例

用地红线	新建球场
室外标高	绿化
球场出入口	透水混凝土步道
定位坐标	场地挡墙
临时配套用房	

兴隆足球公园项目总平图

总用地面积: 28507.97平方米
绿地总占地面积: 8633.25平方米
球场占地面积: 13732.52平方米
铺装占地面积: 5336.00平方米
临时辅助用房占地面积: 806.20平方米

水土流失防治责任范围及水土保持措施布设竣工验收图

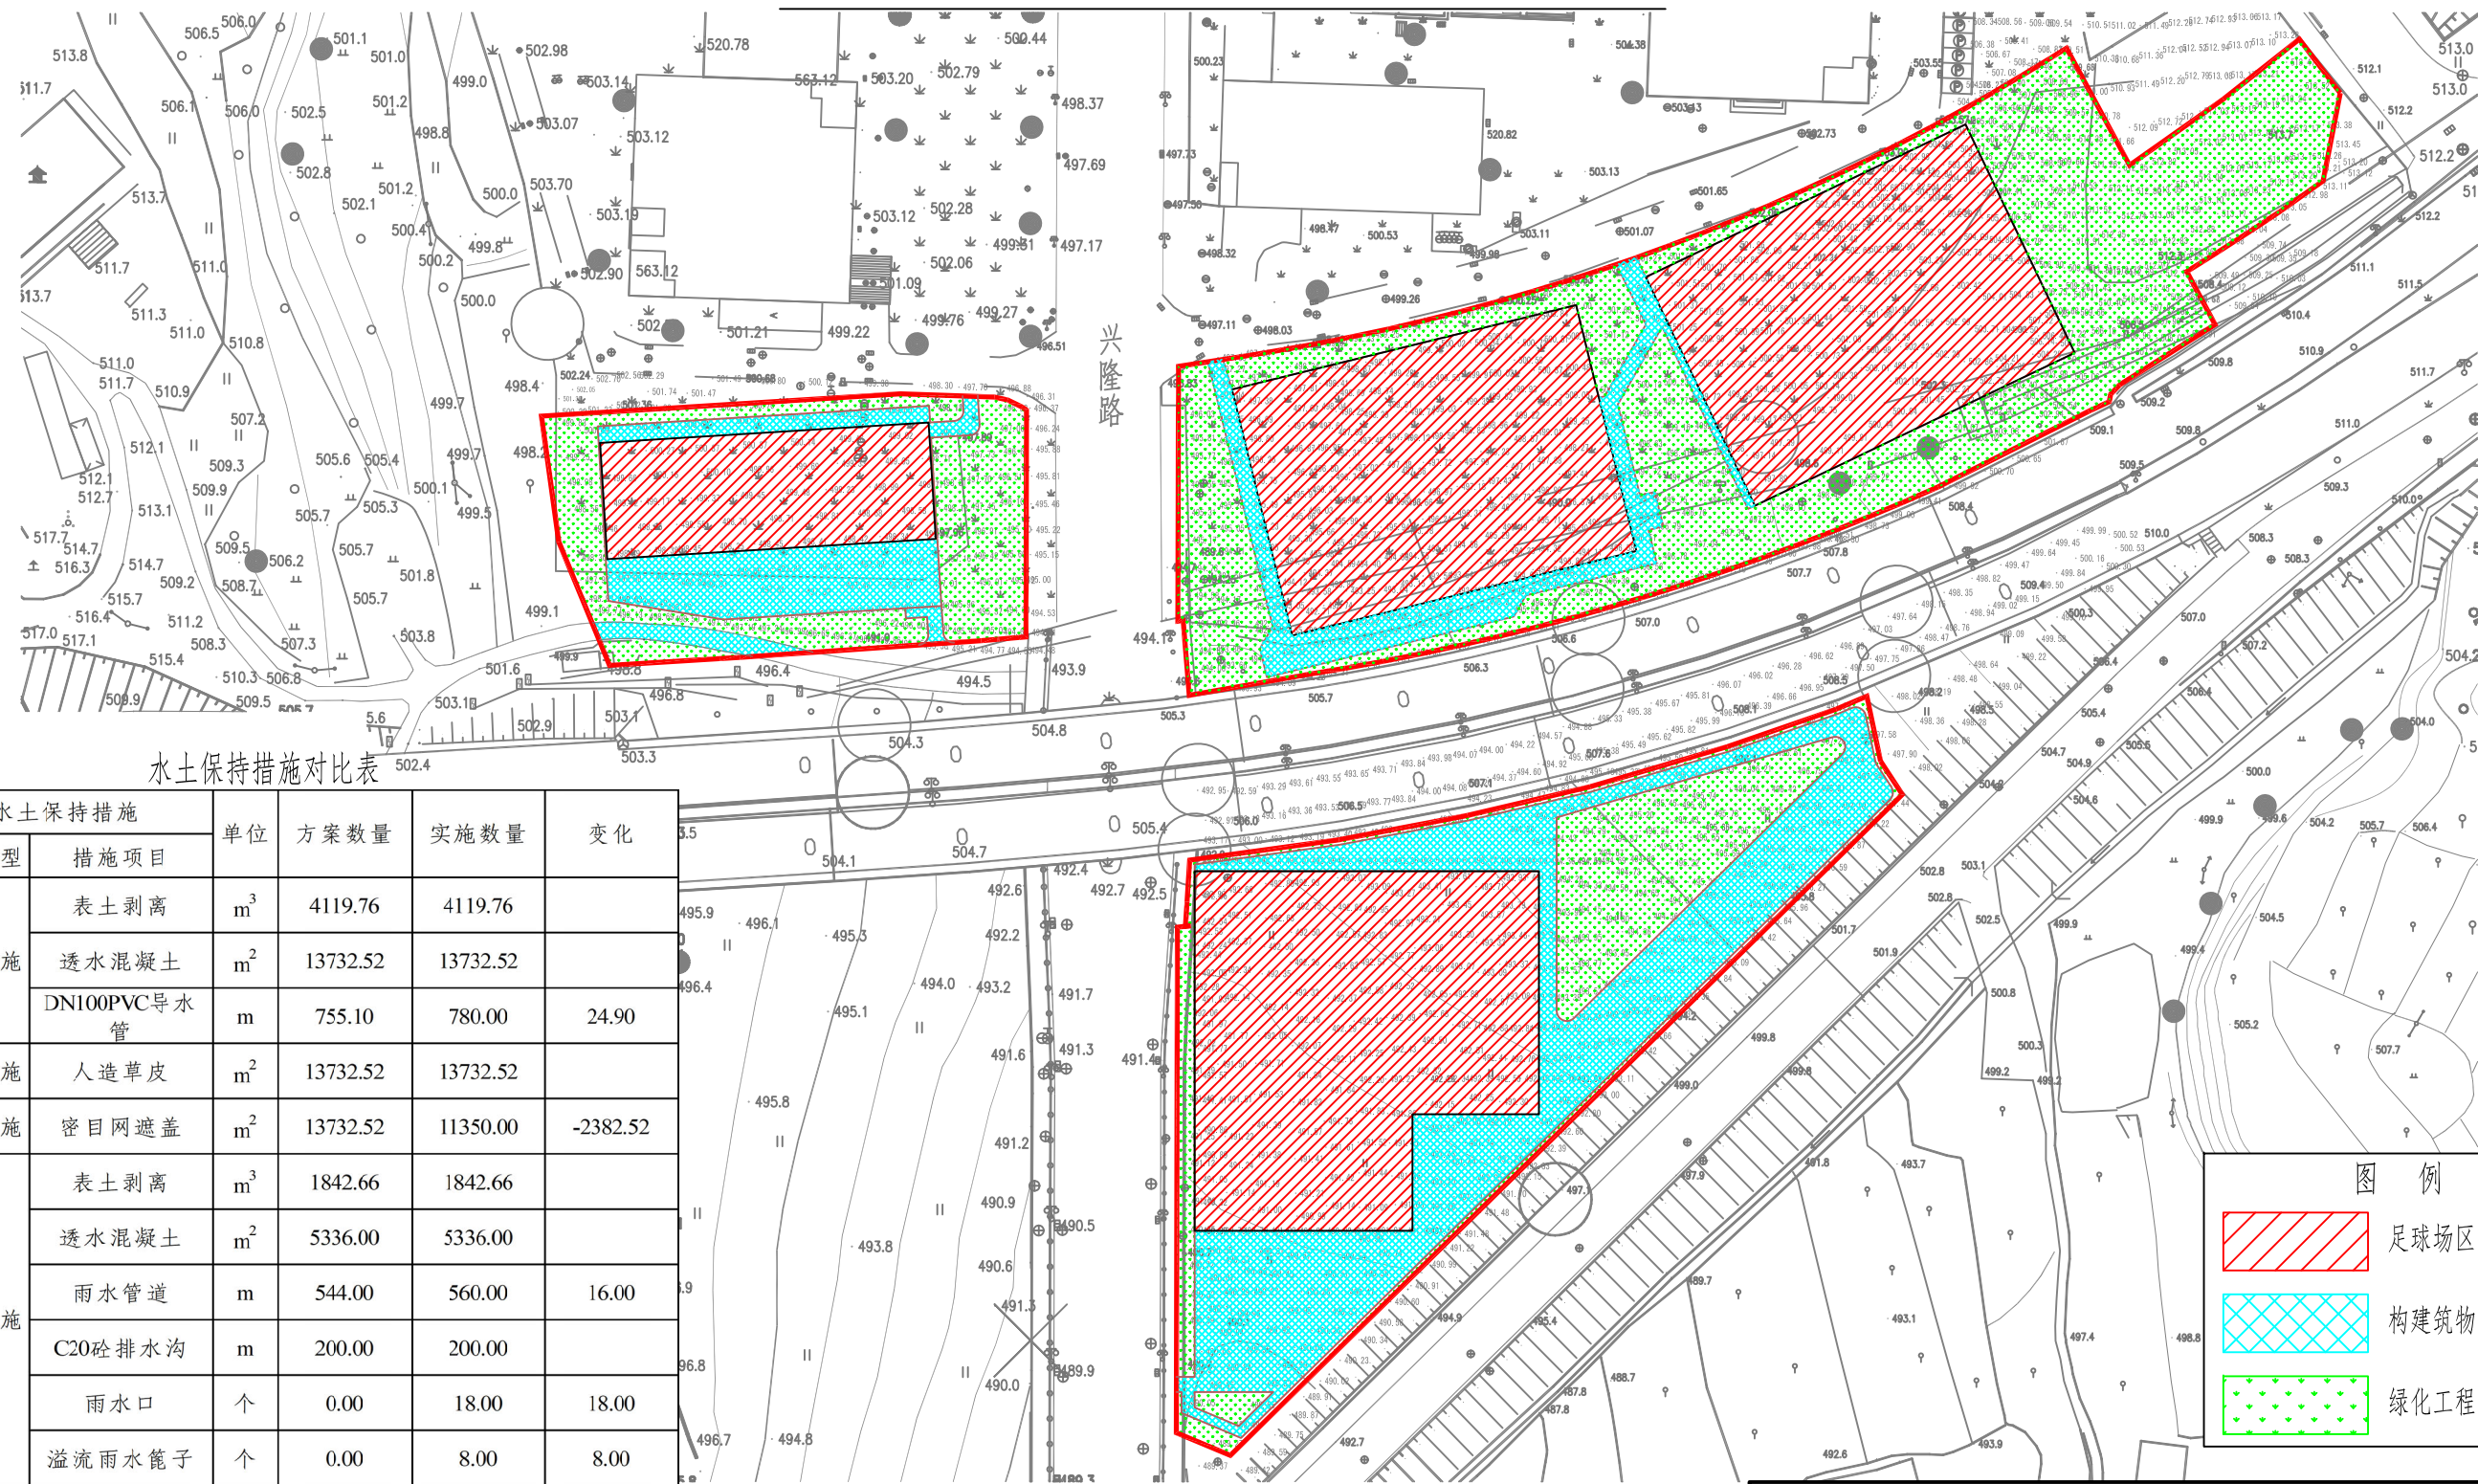

水土保持措施对比表

防治分区	水土保持措施		单位	方案数量	实施数量	变化
	措施类型	措施项目				
足球场区	工程措施	表土剥离	m³	4119.76	4119.76	
		透水混凝土	m²	13732.52	13732.52	
		DN100PVC导水管	m	755.10	780.00	24.90
	植物措施	人造草皮	m²	13732.52	13732.52	
	临时措施	密目网遮盖	m²	13732.52	11350.00	-2382.52
构建筑物区	工程措施	表土剥离	m³	1842.66	1842.66	
		透水混凝土	m²	5336.00	5336.00	
		雨水管道	m	544.00	560.00	16.00
		C20砼排水沟	m	200.00	200.00	
		雨水口	个	0.00	18.00	18.00
		溢流雨水篦子	个	0.00	8.00	8.00
	临时措施	洗车池	处	2.00	1.00	-1.00
		密目网遮盖	m²	6142.20	5800.00	-342.20
绿化工程区	工程措施	表土剥离	m³	2589.98	2589.98	
		表土回填	m³	8552.40	8552.40	
		雨水管道	m	136.00	155.00	19.00
		植草沟	m	563.00	545.00	-18.00
	植物措施	景观绿化工程	m²	8633.25	8633.25	
	临时措施	密目网遮盖	m²	8633.25	8633.25	

图例

足球场区

构建筑物区

绿化工程区

水土保持防治责任范围面积对比表

占地属性	项目组成	水保方案防治责任的范围 (hm²)	实际防治责任的范围 (hm²)	备注
永久占地	足球场区	1.37	1.37	
	构建筑物区	0.62	0.62	
	绿化工程区	0.86	0.86	
合计		2.85	2.85	

四川天辰工程咨询有限公司
Tianchen Engineering Consulting Co., Ltd. of Sichuan

核定	李松		兴隆足球公园项目	验收阶段		
审核	王松			水保部分		
审查	王松		水土流失防治责任范围及水土保持措施布设竣工验收图			
校核	王家德					
设计制图	李松					
发证单位	中华人民共和国住房和城乡建设厅		比例	示意	日期	2025.09
设计证号	A151033459		图号	MY-XL-ZQGY-ZPM-01		

项目建设前遥感影像图



项目建设后遥感影像图

